


## 平成 28 年熊本地震により発生した災害廃棄物処理の進捗状況

平成 28 年熊本地震により熊本県内において発生した災害廃棄物の処理について、進捗状況は以下のとおり。

### (1) 災害廃棄物の処理状況

平成 29 年 2 月末時点

	廃棄物発生推計量 (A)	処理量 (B=C+D)		再生利用率 (C÷B)	処理進捗率 (B÷A)
		再生利用 (C)	処分 (D)		
<b>4月～2月まで</b>	<b>316万t</b>	<b>140万t</b>	<b>97万t</b>	<b>69%</b>	<b>44%</b>
4月～1月		123万t	83万t	67%	39%
4月～12月		107万t	70万t	66%	34%
4月～11月		88万t	56万t	64%	28%
4月～10月		72万t	44万t	61%	23%
4月～9月		57万t	33万t	58%	18%
4月～8月		47万t	25万t	52%	15%

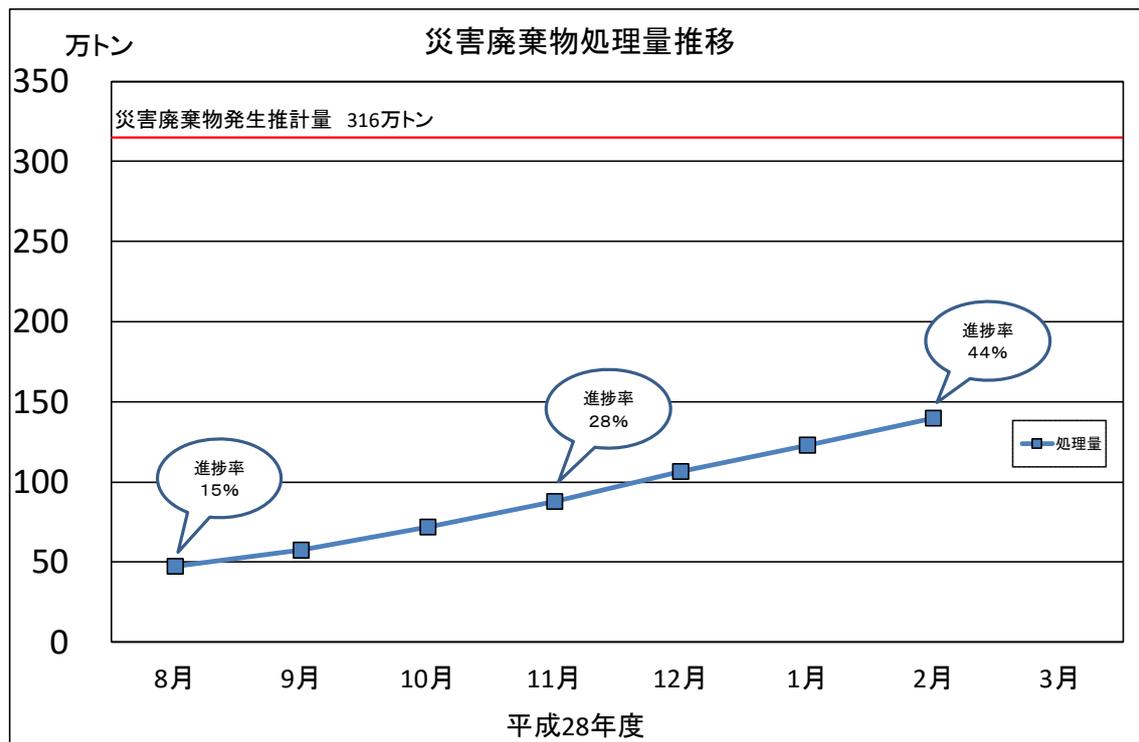


※平成 28 年 10 月及び 11 月に公表した災害廃棄物発生推計量は熊本県災害廃棄物処理実行計画（平成 28 年 6 月策定）に基づく 195 万トンでしたが、災害等廃棄物処理事業費の査定に当たり市町村が推計した災害廃棄物発生量を合計した 316 万トンに修正しています。  
 ※3 月に公表した数値についても精査し、一部変更しています。

(2) 損壊家屋等の公費解体の状況

平成 29 年 3 月末時点

	解体想定棟数 (A)	申請棟数 (B)	解体済棟数 (C)	解体進捗率	
				(C/A)	(C/B)
7月～3月まで	34,749棟	33,554棟	20,487棟	59%	61%
7月～2月	33,182棟	31,405棟	17,108棟	52%	54%
7月～1月	33,131棟	29,838棟	14,570棟	44%	49%
7月～12月	33,078棟	26,393棟	11,636棟	35%	44%
7月～11月	32,608棟	23,833棟	8,569棟	26%	36%
7月～10月	28,782棟	21,769棟	6,004棟	21%	28%
7月～9月		19,165棟	4,168棟	14%	22%
7月～8月		18,097棟	2,598棟	9%	14%

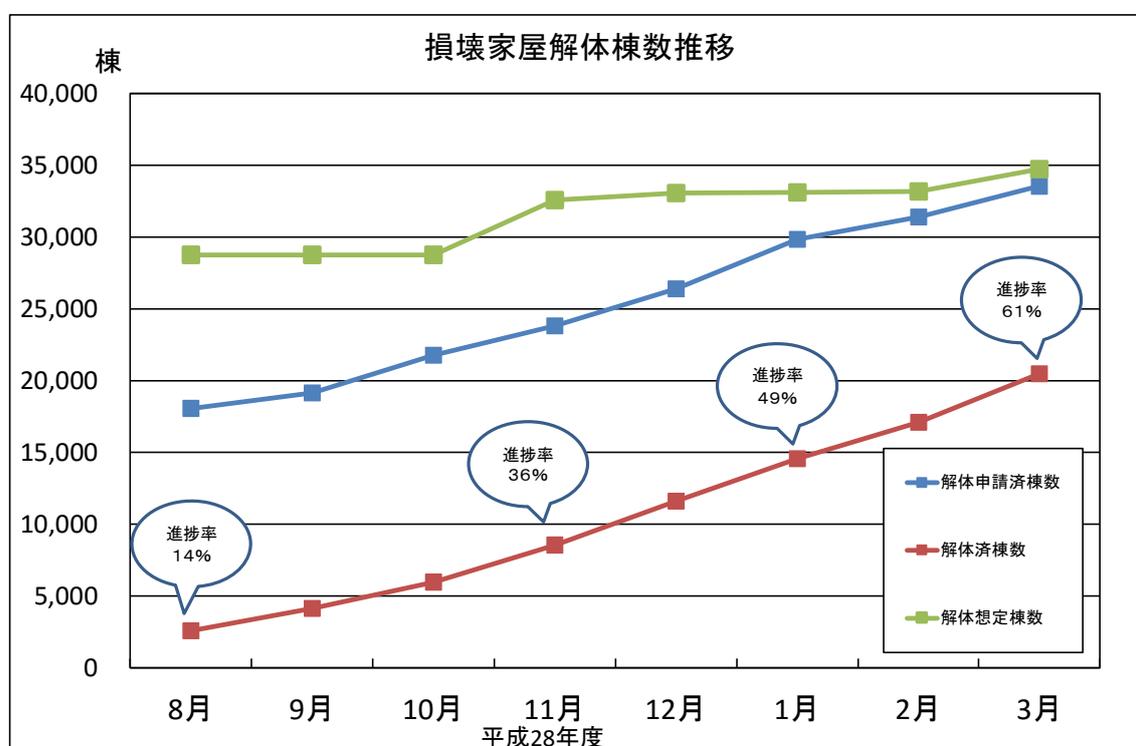

※熊本市については、棟数ではなく申請件数を計上しています。  
 ※3月に公表した数値についても精査し、一部変更しています。

【連絡先】

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部  
 廃棄物対策課災害廃棄物対策室  
 代表 03-3581-3351、直通 03-5521-8358  
 対策官：小岩 真之（内線 7853）  
 課長補佐：荒井 昌典（内線 6870）  
 係長：切川 卓也（内線 6825）
