


平成 28 年熊本地震により発生した災害廃棄物処理の進捗状況

平成 28 年熊本地震により熊本県内において発生した災害廃棄物の処理について、進捗状況は以下のとおり。

(1) 災害廃棄物の処理状況

平成 29 年 10 月末時点

| | 廃棄物発生推計量 (A) | 処理量 (B=C+D) | | | 再生利用率 (C÷B) | 処理進捗率 (B÷A) |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 再生利用 (C) | 処分 (D) | | | |
| H28年4月～H29年10月 | 289万t | 269万t | 199万t | 69万t | 74% | 93% |
| ～H29年9月 | | 256万t | 189万t | 67万t | 74% | 89% |
| ～H29年8月 | | 243万t | 178万t | 65万t | 73% | 84% |
| ～H29年7月 | | 231万t | 165万t | 66万t | 71% | 80% |
| ～H29年6月 | | 217万t | 155万t | 63万t | 71% | 75% |
| ～H29年5月 | | 202万t | 143万t | 59万t | 71% | 70% |
| ～H29年4月 | | 179万t | 127万t | 52万t | 71% | 62% |
| ～H29年3月 | | 158万t | 111万t | 47万t | 70% | 55% |
| ～H29年2月 | | 140万t | 98万t | 43万t | 70% | 48% |
| ～H29年1月 | | 123万t | 84万t | 40万t | 68% | 43% |
| ～H28年12月 | | 107万t | 71万t | 36万t | 66% | 37% |

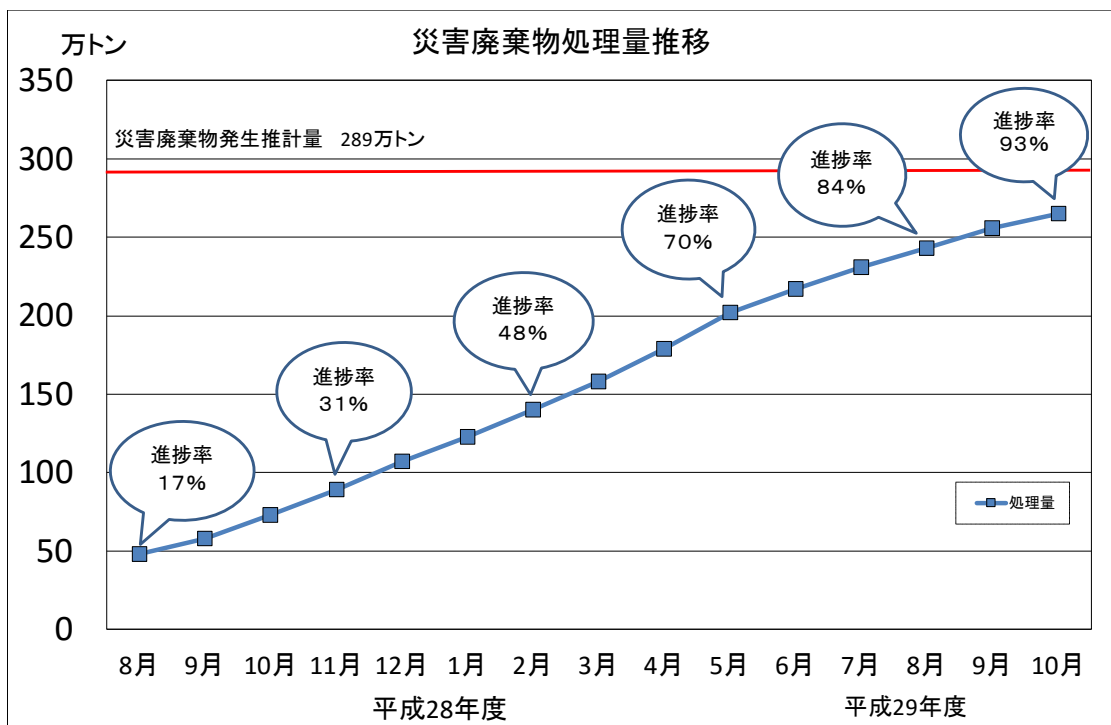


※平成 28 年 12 月から 29 年 5 月まで公表した災害廃棄物発生推計量は災害等廃棄物処理事業費の査定に当たり市町村が推計した災害廃棄物発生量を合計した 316 万トンでしたが、熊本県災害廃棄物処理実行計画第 2 版（平成 29 年 6 月）に基づき 289 万トンに修正しています。

(2) 損壊家屋等の公費解体の状況

平成29年11月末時点

| | 申請棟数 (A) | 解体済棟数 (B) | 解体進捗率 (B/A) |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| H28年7月～H29年11月 | 35,766棟 | 33,540棟 | 94% |
| ～H29年10月 | 35,754棟 | 32,471棟 | 91% |
| ～H29年9月 | 35,574棟 | 30,984棟 | 87% |
| ～H29年8月 | 35,366棟 | 29,500棟 | 83% |
| ～H29年7月 | 35,184棟 | 27,847棟 | 79% |
| ～H29年6月 | 34,851棟 | 26,115棟 | 75% |
| ～H29年5月 | 34,456棟 | 23,863棟 | 69% |
| ～H29年4月 | 34,178棟 | 22,244棟 | 65% |
| ～H29年3月 | 33,554棟 | 20,799棟 | 62% |
| ～H29年2月 | 31,405棟 | 17,358棟 | 55% |
| ～H29年1月 | 29,838棟 | 14,774棟 | 50% |
| ～H28年12月 | 26,393棟 | 11,857棟 | 45% |

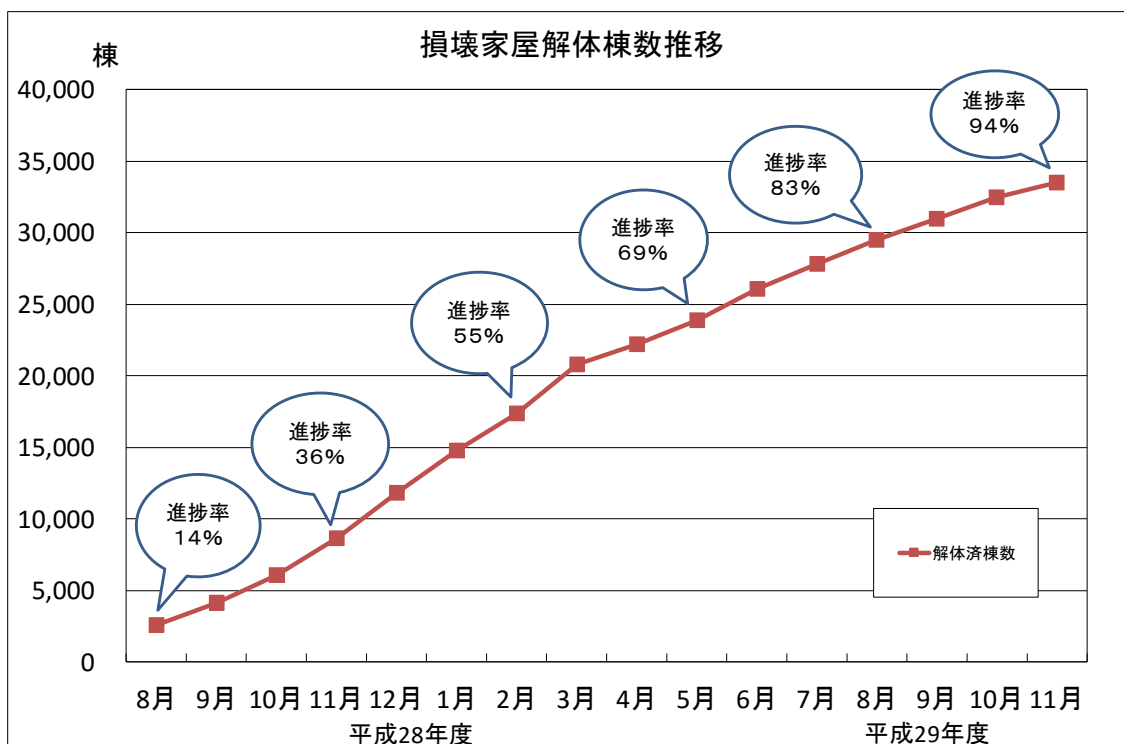

※熊本市については、棟数ではなく申請件数を計上しています。
 ※11月に公表した数値についても精査し、一部変更しています。

【連絡先】

環境省環境再生・資源循環局
 環境再生事業担当参事官付
 災害廃棄物対策室

代表 03-3581-3351、直通 03-5521-8358
 対策官：小岩 真之（内線 7853）
 課長補佐：荒井 昌典（内線 6870）
 係長：切川 卓也（内線 6825）
